https://github.com/wisetg/Software_Engineering

[수리점 정보를 편하게 알 수 있는 플랫폼]

프로젝트 관리 계획서

- 박태건 -

문서번호 : [고침]프로젝트관리계획서_260413_Doc-002

소 속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과

팀 명 : 고침

팀 원 : 박태건, (팀원A, 팀원B)

교 수 : 최차봉 교수

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비 고
1	2026.04.13	박태건	프로젝트 관리 계획서 초안 작성	

목 차

1. 서론 ---------- 1
1.1 문서의 목적 및 범위 ---------- 1
1.2 프로젝트 개요 ---------- 1
1.3 프로젝트 목표 ---------- 2
1.4 용어 정의 ---------- 2
1.5 참조 문서 ---------- 2

2. 개발 계획 ---------- 3
2.1 개발 절차 모형 ---------- 3
2.2 WBS(Work Breakdown Structure) ---------- 3
2.3 개발 내용 ---------- 4
2.4 개발 일정 ---------- 5

3. 팀 구성 ---------- 6
3.1 팀 구조 ---------- 6
3.2 역할 및 책임 ---------- 6

4. 품질 관리 ---------- 7
4.1 팀 미팅 계획 ---------- 7
4.2 변경 사항 관리 방법 ---------- 7
4.3 산출물 관리 방법 ---------- 8

5. 개발 환경 ---------- 9
5.1 하드웨어 환경 ---------- 9
5.2 소프트웨어 환경 ---------- 9
5.3 기타 개발 환경 ---------- 9

6. 산출물 ---------- 10
6.1 산출물 정의 ---------- 10
6.2 산출물 작성일 및 담당자 ---------- 10
6.3 기타 제약사항 ---------- 11

7. 기타 사항 ---------- 11
7.1 리스크 관리 ---------- 11
8. 참고문헌 및 부록 ---------- 11

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 '수리점 정보를 편하게 알 수 있는 플랫폼' 개발 프로젝트의 전반적인 관리 계획을 수립하는 데 목적이 있다. 프로젝트의 목표, 일정, 팀 구성, 품질 관리 및 개발 환경을 정의하여 성공적인 시스템 구축을 위한 가이드라인을 제공한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

① 프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)
② 개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 내용 및 일정, 소프트웨어/하드웨어 환경)
③ 팀 구성 (팀 구조/역할 및 책임)
④ 품질관리 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리)
⑤ 산출물 (산출물 정의, 작성일 및 담당자)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

고장난 PC나 여러가지 고장물품들을 수리, 수선할 수 있는 업체를 검색할 수 있는 웹사이트를 제작하고, 이를 재구성한 앱을 제작한다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	GPS를 활용하여 내 주변의 수리점을 확인하고 카테고리별 필터링 기능 제공
F02	고장 부위 사진/증상 업로드 시 여러 수리점으로부터 예상 견적 수신
F03	수리 가능 품목, 영업시간, 보유 장비 등 업체 정보 관리 및 홍보
F04	고객의 견적 요청 답변 작성 및 예약 스케줄 대시보드 관리
F05	채팅 및 푸시 알림을 통한 실시간 고객 응대 기능

1.3 프로젝트 목표

본 시스템은 소비자와 수리점을 연결하는 플랫폼을 제공하여 수리점정보를 쉽게 찾고, 실시간으로 소통할 수 있도록 하는 플랫폼을 웹사이트로서 제작한다. 또한 더 많은 사람들이 편하게 접근할 수 있도록 애플리케이션으로 제작한다.

1.4 용어 정의

해당사항 없음

1.4 참조 문서

[김검정]시스템정의서_191013_Doc-001.hwp
[김검정]시스템정의서_191111_Doc-002.hwp

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

1) 소프트웨어를 개발하기 위한 개발 절차 모형

본 프로젝트는 Agile모델중 SCRUM모델을 채택하여 개발을 진행한다. 이는 변화에 민첩하게 반응하고, 유연한 사고로 문제를 해결하고, 지속적인 해결을 하기 위함이다.

2) 개발 절차 모형과 함께 분석, 설계를 진행하기 위한 방법론

여러 가지 모델링 개념과 캡슐화 등을 잘 지원하는 객체지향 방법 론을 채택하였다. 시스템을 독립적인 '객체'들의 집합으로 파악하고, 객체 간의 상호작용을 통해 기능을 구현하는 방법론을 적용한다.

2.2 WBS(Work Breakdown Structure)

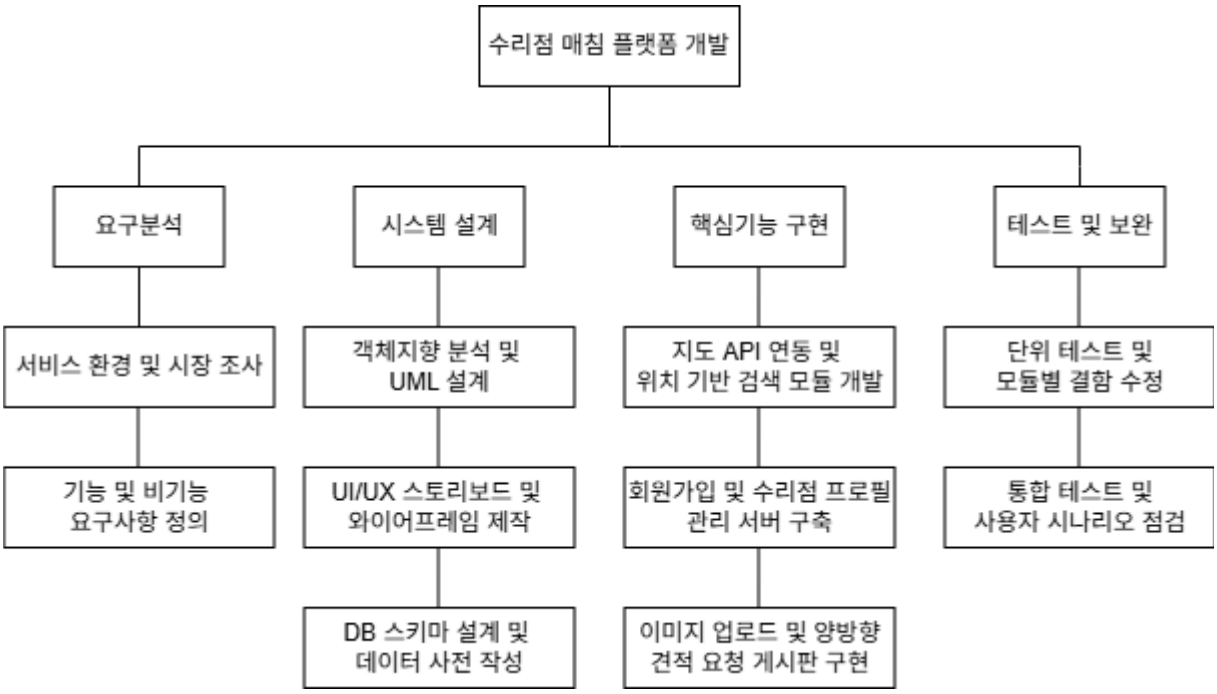

2.3 개발 활동

개발 활동	설명
프로젝트 요약	프로젝트 요약서 작성
프로젝트 계획	프로젝트 계획서 작성
요구사항 정의	요구사항 정의서 작성
요구사항 분석	요구사항 분석서 작성
Product Backlog	요구사항을 우선순위대로 순서화
Sprint Planning Meeting	스프린트가 시작될 때마다 목표 설정 및 백로그 확정
Daily Scrum Meeting	매일 개발 시작 전에 진행상황과 이슈 사항, 계획 공유
Sprint	1~4주 단위로 짧게 프로그램을 개발하면서 개발자들끼리 피드백 제공
Sprint Retrospective	스프린트 기간 동안 팀 내부에서 발생한 일들을 회고하며 개선할 것, 잘한 것, 새로 시작할 것을 도출
Sprint Review	스프린트 종료 시점에 개발된 기능 시연 및 시스템 정의서 대비 요구사항 충족 여부 검토

2.4 개발 일정

활동	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
프로젝트 요약												
프로젝트 계획												
요구사항 정의 및 분석												
Product Backlog												
Sprint Planning Meeting												
Sprint 1												
Sprint 2												
Sprint 3												
Sprint 4												
Sprint 5												
Sprint 6												
Sprint 7												
Sprint 8												
Sprint 9												
Sprint 10												
Daily Scrum Meeting												
Sprint Retrospective												
Sprint Review												
프로젝트 종료												

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

본 프로젝트는 효율적인 의사결정과 빠른 개발 속도를 위해 기능 중심의 유연한 조직 구성을 지향한다. (현재 1인 개발 프로젝트)

3.2 역할 및 책임

이름	역할	책임 (공동 / 개별)	
박태건	팀장	문서관리 자료조사	프로젝트의 전반적인 진행 및 검토
팀원A	팀원		시스템 설계 및 풀스택 개발
팀원B	팀원		품질 보증 (QA)

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

(1) Sprint Planning Meeting
- 미팅 시간 : 매주 월요일 오전 9시
- 토의 내용 : 해당 주차(Sprint)에 개발할 핵심 기능 목표 설정 및 백로그(Backlog) 확정
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(2) Daily Scrum Meeting
- 팀 미팅 시간 : 매일 개발 시작 전 15분간 진행
- 토의 내용 : 전날 개발 진척도 점검, 금일 구현할 모듈 확인, 기술적 이슈(장애 현상) 공유 및 해결 방안 모색
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(3) Sprint Review
- 미팅 시간 : 매주 금요일 오후 5시 (Sprint 종료 시점)
- 토의 내용 : 한 주간 개발된 기능 시연 및 시스템 정의서 대비 요구사항 충족 여부 검토
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장

(4) Sprint Retrospective
- 팀 미팅 시간 : Sprint Review 직후
- 토의 내용 : 개발 과정에서의 효율성 회고, 개선해야 할 코드 작성 습관이나 반복되는 버그 패턴 분석, 다음 Sprint에 적용할 점 도출

(5) 비정기 회의
- 중대한 설계 변경, 외부 API(지도, 결제 등) 연동 문제, 혹은 교수님 피드백에 따른 수정이 필요한 경우 진행
- 미팅 참석자 : 팀원, 팀장, (지도교수, 멘토)

4.2 변경사항 관리 방법

- 기능 변경이나 설계 수정 발생 시, 변경 전/후의 로직을 Git Commit Log 및 이슈 트래커에 반드시 기록으로 남긴다.
- 프로젝트의 범위가 크게 변동되는 경우 지도 교수님께 보고하여 타당성을 검토받으며, 그에 따라 일정을 재조정한다.
- 변경된 사항은 '프로젝트 관리 계획서'의 제/개정 이력에 즉시 반영하여 최신본을 유지한다.

4.3 산출물 관리 방법

(1) 산출물에 대한 명명(Naming) 방법
- 소프트웨어 : 버전_해당 버전의 산출 일자
  (ex. v1_2019_10_11.exe)
- 문서 : [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
  (ex. [고침]프로젝트관리계획서_191025_Doc-001.hwp)
- 그 외 파일 : 해달 파일의 목적이 명확하게 들어나는 이름
  (ex. 191025_video.h264)

(2) 산출물의 버전 관리 방법 및 버전관리 담당자
- 소프트웨어 : Git Tag 기능을 활용하여 주요 마일스톤별 버전을 관리한다.. (담당자: 팀원 전체)
- 문서 : 파일명 맨 뒤에 날짜를 기재하고, 문서 내에 제/개정 이력을 수정한다. (담당자 : 팀원A)
- 그 외 파일 : 이미지, 아이콘 등 리소스 파일은 해당 목적과 날짜를 포함하여 관리한다.
  (담당자 : 전체)

(3) 산출물의 저장 방법
- 소프트웨어 : Github
- 문서 : 개인 로컬 저장소 및 팀원 공유 클라우드서버
- 그 외 파일 : 클라우드 스토리지

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 개발 환경

구분	spec
노트북	- Intel Core i7/i9 - RTX 2080ti - RAM 16GB

5.2 소프트웨어 개발 환경

구분	type	spec
Window	OS	Window 11

5.3 기타 개발 환경

해당없음

6. 산출물

6.1 산출물 정의

형식 : [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

ex)
- [고침]시스템정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [고침]프로젝트관리계획서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [고침]요구사항정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [고침]요구사항분석서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [고침]소프트웨어설계서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

6.2 산출물 작성일 및 담당자

산출물	최종 작성일	최종 검토자	작성 책임자
[고침]시스템정의서	2026-03-16	박태건	박태건
[고침]프로젝트관리계획서	2026-04-13	박태건	박태건
[고침]요구사항정의서	2026-05-10	박태건	박태건
[고침]요구사항분석서	2026-06-05	박태건	박태건
[고침]소프트웨어설계서	2026-06-29	박태건	박태건

6.3 기타 제약사항

해당사항 없음

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

No	Risk	Critical	Occur	Mitigation Plan	Alternative	Respon
1	수리점 원천 데이터 확보 부족	High	high	공공데이터 포털의 전국 수리업체 API를 우선적으로 연동하고, 학교 인근 등 시범 지역을 설정하여 수동 데이터 수집 병행함.	데이터 확보가 늦어질 경우, 사용자가 직접 수리점을 등록하고 포인트를 받는 '사용자 참여형 데이터 등록' 기능을 우선 활성화함.	박태건
2	일정 지연	middle	Low	모든 코드는 GitHub에 매일 Push하며, 진행 상황을 WBS와 대조하여 주간 단위로 점검하고 이슈 사항을 기록함.	지연이 심화될 경우 핵심 기능을 우선 완성하고, 부가 기능은 차기 버전으로 일정을 조정함.	박태건
3	플랫폼별 UI/UX 호환성 문제	middle	middle	Flutter 프레임워크를 활용하여 코드 단일화를 꾀하고, 주요 타겟 기기(iPad, 스마트폰)에서 레이아웃 테스트를 주기적으로 실시함.	특정 기기에서 심각한 레이아웃 깨짐 발생 시, 복잡한 위젯 대신 반응형 웹 뷰 형태의 인터페이스를 부분적으로 도입함.	팀원A

8. 참고문헌 및 부록

-부록 1 : 시스템정의서 ([고침]시스템정의서_260316_Doc-001)
